

CONSTRUCTION UPDATE NOVEMBER 2025




MIDDLE SCHOOL

The completion of the aggregate piers marks a significant milestone in the middle school expansion project. Each pier was set with careful coordination and technical precision, forming a critical component of the building's structural foundation. Securing the final pier represents the collective effort of engineers, contractors, and onsite teams whose expertise ensured a safe and efficient installation process.

Next up is the building permit! Once received, we will continue with building the middle school addition.

Scan the QR code to the right to see a video of pier construction in action!

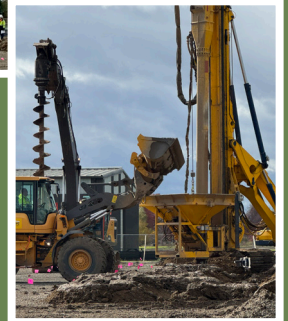

ELEMENTARY SCHOOL

- Bid Package for the elementary School is being advertised for Bid on 12/3/2025 with a bid date of 1/8/2026



HIGH SCHOOL

- Early work package was bid for the HVAC in the Gym and work will be starting over winter break
- The remainder of the work will be advertised for Bid on 1/7/2026 with a bid date of 2/3/2026

READER BOARD & SIGNAGE PROJECT

The Reader Board & Signage project is entering its final phase, awaiting permit approval. Once permits are finalized, installation will move quickly and will provide improved communication, energy-efficient LED displays, and a modern look that represents the Gervais Community's pride in its schools.

LOOKING AHEAD

ELEMENTARY SCHOOL

- Work on Summer 2026 Bid Package

MIDDLE SCHOOL

- Receive Building Permit and Continue Construction

HIGH SCHOOL

- Work on the New Heating and Cooling System for the Gym, which will start during the holiday break



Scan for More
Bond Updates!



ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN NOVIEMBRE 2025




ESCUELA INTERMEDIA

La finalización de los pilares de agregado marca un hito significativo en el proyecto de ampliación de la escuela intermedia. Cada pilar fue instalado con una coordinación cuidadosa y precisión técnica, formando un componente fundamental de la estructura del edificio. Asegurar el último pilar representa el esfuerzo colectivo de ingenieros, contratistas y equipos de obra, cuya experiencia garantizó un proceso de instalación seguro y eficiente.

El siguiente paso es el Permiso de Construcción de Gervais. Una vez recibido, continuaremos con la construcción de la ampliación de la escuela intermedia.

Escanee el código QR a la derecha para ver un video del distrito mostrando la construcción activa del pilar.

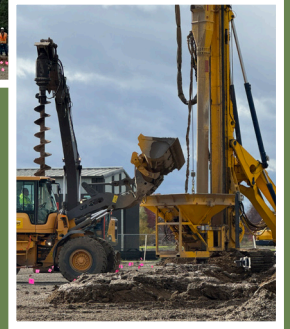

ESCUELA PRIMARIA

- El paquete de licitación para la Escuela Primaria será publicado para licitar el 3 de diciembre, con fecha de apertura de propuestas el 8 de enero.



ESCUELA SECUNDARIA

- El paquete de obra preliminar para el sistema HVAC del gimnasio ya fue licitado, y el trabajo comenzará durante las vacaciones de invierno.
- El resto del trabajo será publicado para licitar el 7 de enero, con fecha de apertura de propuestas el 3 de febrero.

PROYECTO DE PANELES ELECTRÓNICOS Y SEÑALIZACIÓN

El proyecto de Letrero Electrónico y Señalización está entrando en su fase final de espera de la aprobación del permiso. Una vez aprobados, la instalación avanzará rápidamente y proporcionará una comunicación mejorada, pantallas LED de bajo consumo y una apariencia moderna que representa el orgullo de la comunidad de Gervais en sus escuelas.

MIRANDO HACIA ADELANTE

ESCUELA PRIMARIA

- Trabajando en el paquete de licitación de verano de 2026

ESCUELA INTERMEDIA

- Recibir el permiso de construcción y continuar la construcción

ESCUELA SECUNDARIA

- Las obras del nuevo sistema de calefacción y refrigeración del gimnasio comenzarán durante las vacaciones



Scan for More
Bond Updates!

